Проект лесовосстановления на лесном участке N 6/12-26/2026 год

Лесовосстановление: искусственное лесовосстановление

Субъект Российской Федерации: Курская область

Лесной район: Лесостепной район европейской части Российской Федерации

Характеристика местоположения лесного участка:

Лесничество (муниципальный район (ОКТМО)): Льговское

Участковое лесничество: Банищанское

Урочище (при наличии): нет данных

N квартала учётный (N квартала по лесоустройству): 46:6:1:63(70)

Номер объекта: 1

N выдела учётный (по лесоустройству): 46:6:1:63:14 (16) Площадь га: 1.1

Площадь лесного участка, га: 1.1

(исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10000 прилагаются к проекту лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:

Рельеф участка (уклон): Равнинный

Гидрологические условия (увлажнение): свежие

Почва: Деградированные глубоко гумусированные черноземные

Тип леса: Свежая дубрава

Характеристика площадей лесного участка:

Вырубка 2024

(вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли)

Характеристика вырубки:

Количество пней, тыс. штук/га: 0.2

Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников: Отсутствуют

Степень задернения почвы: слабая

Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 0

Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, куб.м): отсутствует (до 5 м3/га)>

а) отсутствует (до 5 куб.м/га); б) слабая (5 - 20 куб.м/га); в) средняя (20 – 50 куб.м/га); г) сильная (более 50 куб. /га)

Категория доступности для техники: доступная

а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:

состав пород: нет данных

средний возраст, лет: нет данных

средняя высота, м: нет данных

количество деревьев и кустарников, тыс. штук/га: нет данных

размещение их по площади лесного участка (равномерное, неравномерное,

групповое): нет данных

состояние лесных насаждений и их оценка: нет данных

Проектируемый способ лесовосстановления:

искусственное лесовосстановление

(естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка))

Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

в связи с отсутствием подроста выбран способ искусственного лесовосстановления

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

Разметка будущих рядов лесных культур - осень 2026

Механизированная обработка почвы - нарезка борозд (расстояние между центрами борозд - 3м - октябрь 2026. Посадка лесных культур - октябрь 2026. Оборудование: плуг ПКЛ-70, трактор "Беларус" МТЗ-82.

Метод создание лесных культур - посадка в ряды (1,5 м под меч Колесова. Схема смешения 10Дч (ДчДчДчДчДчДч...)

Посадочный материал: дуб черешчатый двух лет с закрытой корневой системой.

Сособ создания лесных культур - ручная посадка

количество:2,2 тыс.шт/га

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

1 год (2027) 4кратный уход - май, июль, август, сентябрь

2 год (2028) 3кратный уход - июнь, август, сентябрь

3 год (2029) 2кратный уход - июль, сентябрь

4 год (2030) 2кратный уход - июнь, октябрь

5 год (2031) 1 кратный уход - июль

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

6 год - 1 кратный уход. Сентябрь

Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:

Порода	Вид посадочного материала *(сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район)*	Возраст не менее, лет	Высота не менее, см	Диаметр корневой шейки не менее, мм
Дуб черешчатый (летний, обыкновенный)	сеянцы с закрытой корневой системой	2	15	4

Характеристика посевного материала:

Порода	Класс качества семян	Селекционная категория	Место происхождения *(лесосеменной район)*

Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

Порода	Возраст не менее, лет	Количество деревьев основных лесных пород не менее, тыс. штук/га	Средняя высота не менее, м
Дуб черешчатый (летний, обыкновенный)	7	1.5	1.1

Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га):

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

1.1

Проектируемый объем работ по лесовосстановлению:

(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)

площадь лесовосстановления, га: 1.1

количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород, тыс. штук/га: 2.2

количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на всей площади, тыс. штук /га: 2.42

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Должность генеральный директор

Наименование организации (при наличии)

Евсеенко Алексей Егорович

Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Дата 10 сентября 2026

Число, месяц, год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	135277954446968106572876874690043812643
Владелец:	ООО \"ОРИОН\"
Действителен:	с 30.04.2026 по 30.07.2027

Приложение к проекту лесовосстановления

Сведения о расположении участка леса, приведенного в проекте лесовосстановления			
Номер выдела (по лесоустройству) /кадастровый номер земельного участка	Номер объекта	Площадь участка (общая), га	Площадь лесовосстановления, га (на которой осуществляются лесовосстановительные мероприятия)
46:6:1:63:14 (16)	1	1.1	1.1

Площадь участка лесовосстановления				
Номер объекта	Номер начальной точки (столба)	Номер следующей точки (столба)	Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011)	
			Долгота (X)	Широта (Y)
Привязка участка лесовосстановления				
1	0		35.151976	51.686605
Контур участка лесовосстановления				
1	1		35.151976	51.686605
1	2		35.152385	51.686667
1	3		35.152979	51.686573
1	4		35.153772	51.686543
1	5		35.155498	51.686178
1	6		35.155404	51.685749
1	7		35.154686	51.685866
1	8		35.153753	51.686108
1	9		35.152974	51.686158
1	10		35.152453	51.686236
1	11		35.151976	51.686605
Привязка площади, исключенной из проекта лесовосстановления №				
Контур площади, исключенной из проекта лесовосстановления №				

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Должность генеральный директор

Наименование организации (при наличии)

Евсеенко Алексей Егорович

Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Дата 10 сентября 2026


Число, месяц, год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:	135277954446968106572876874769004381264З
Владелец:	ООО \"ОРИОН\"
Действителен:	с 30.04.2026 по 30.07.2027

План лесного участка

Лесничество:	Льговское	№ квартала:	70
Участковое леснич	Банищанское	№ выдела:	16
Урочище:		№ объекта:	1
Масштаб:	1:10 000	Площадь, га:	1,1

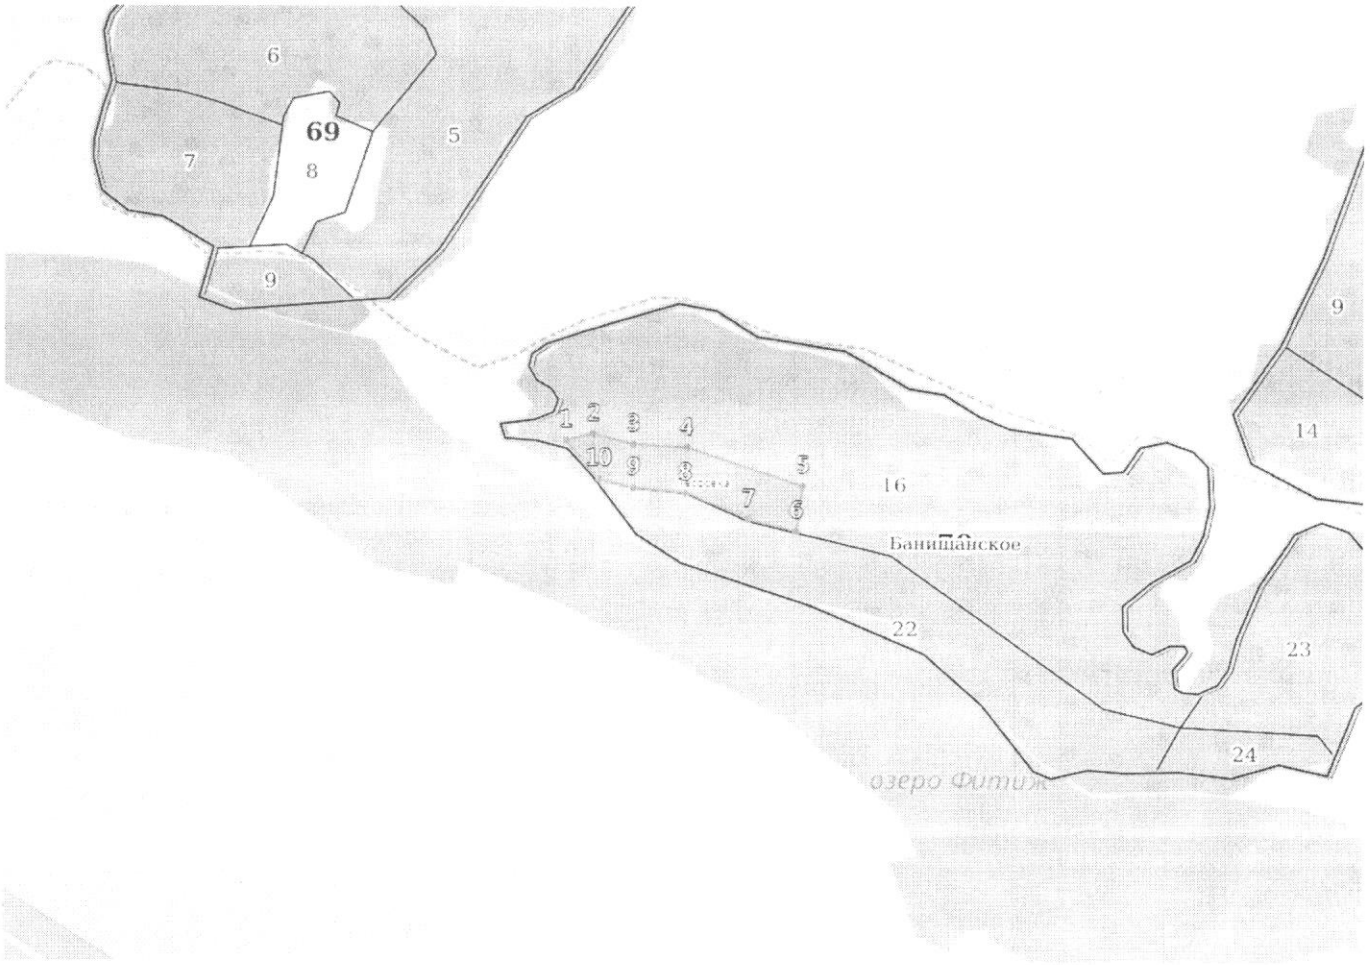

Номер начальной точки (столба) линии	Номер следующей точки (столба) линии	Направление линий, румбы (азимуты),°	Длина линий, м	Координата начальной точки (столба) линии	
				Долгота(X)	Широта (Y)
0	1			35,151976	51,686605
1	2			35,151976	51,686605
2	3			35,152385	51,686667
3	4			35,152979	51,686573
4	5			35,153772	51,686543
5	6			35,155498	51,686178
6	7			35,155404	51,685749
7	8			35,154686	51,685866
8	9			35,153753	51,686108
9	10			35,152974	51,686158
10	11			35,152453	51,686236
11	1			35,151976	51,686605

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

генеральный директор		Евсеенко Алексей Егорович
Должность (При наличии)	Подпись	(Фамилия, имя, отчество - последнее при наличии)

07.09.2026

Число, месяц, год
